# Neubau Neuapostolische Kirche Kempten-St.Mang

## SIGEPLAN (Auszug)

Architekturbüro Rolf Keck

| Zeile-Nr | Gewerk<br>*Gefährdung / Einrichtung* | Lösung Maßnahme | Ordnungsnummer<br>*"Gelbe Mappe"* | Bestimmung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **000 Baustelleneinrichtung** | | | |
| 2 | Baustellensicherung | Bauzaun | | BSO; BGV A1 |
| 3 | Sozialeinrichtungen | Tagesunterkünfte | | |
| 4 | Baugeräte | Standsicherheitsnachweis | B 58;B 59;B 63;B 72 | BGV D6; TRA 1100; BGV D30; AufzV |
| 5 | **002 Erdarbeiten** | | | |
| 6 | Baugrube | Baugrube - unverbaut > 1,25 m Tiefe | | DIN 4124; BGV C22 |
| 7 | Zugang in die Baugrube | Rampe | | BGV C22 |
| 8 | **013 Beton- und Stahlbetonarbeiten** | | | |
| 9 | Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden | Arbeitsgerüst | C 45 | DIN 4420; BGV C22 |
| 10 | Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken | Arbeitsgerüst | C 45 | DIN 4420; BGV C22 |
| 11 | Bodenöffnungen | Abdeckung | | DIN 4420; BGR 179; BGV C22 |
| 12 | **012 Mauerarbeiten** | | | |
| 13 | Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden | Arbeitsgerüst | C 45 | DIN 4420; BGV C22 |
| 14 | Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen | Anlegeleitern | C 22 | BGV D36; BGV C22 |
| 15 | Wandöffnungen | Seitenschutz Wandöffnungen | C 8 | DIN 4420; BGV C22 |
| 16 | Bodenöffnungen | Abdeckung | | DIN 4420 |
| 17 | **017 Stahlbauarbeiten** | | | |
| 18 | Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken | Arbeitsgerüst | | DIN 4420; BGV C22 |
| 19 | Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen | Vorgebaute Gerüstfelder innen Leitergang | | DIN 4420; BGV D36 |
| | **Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen** | | | |
| 20 | | Abdeckung | | |
| 21 | | Arbeitsgerüst | C 45 | |
| 22 | | Rampe | | |

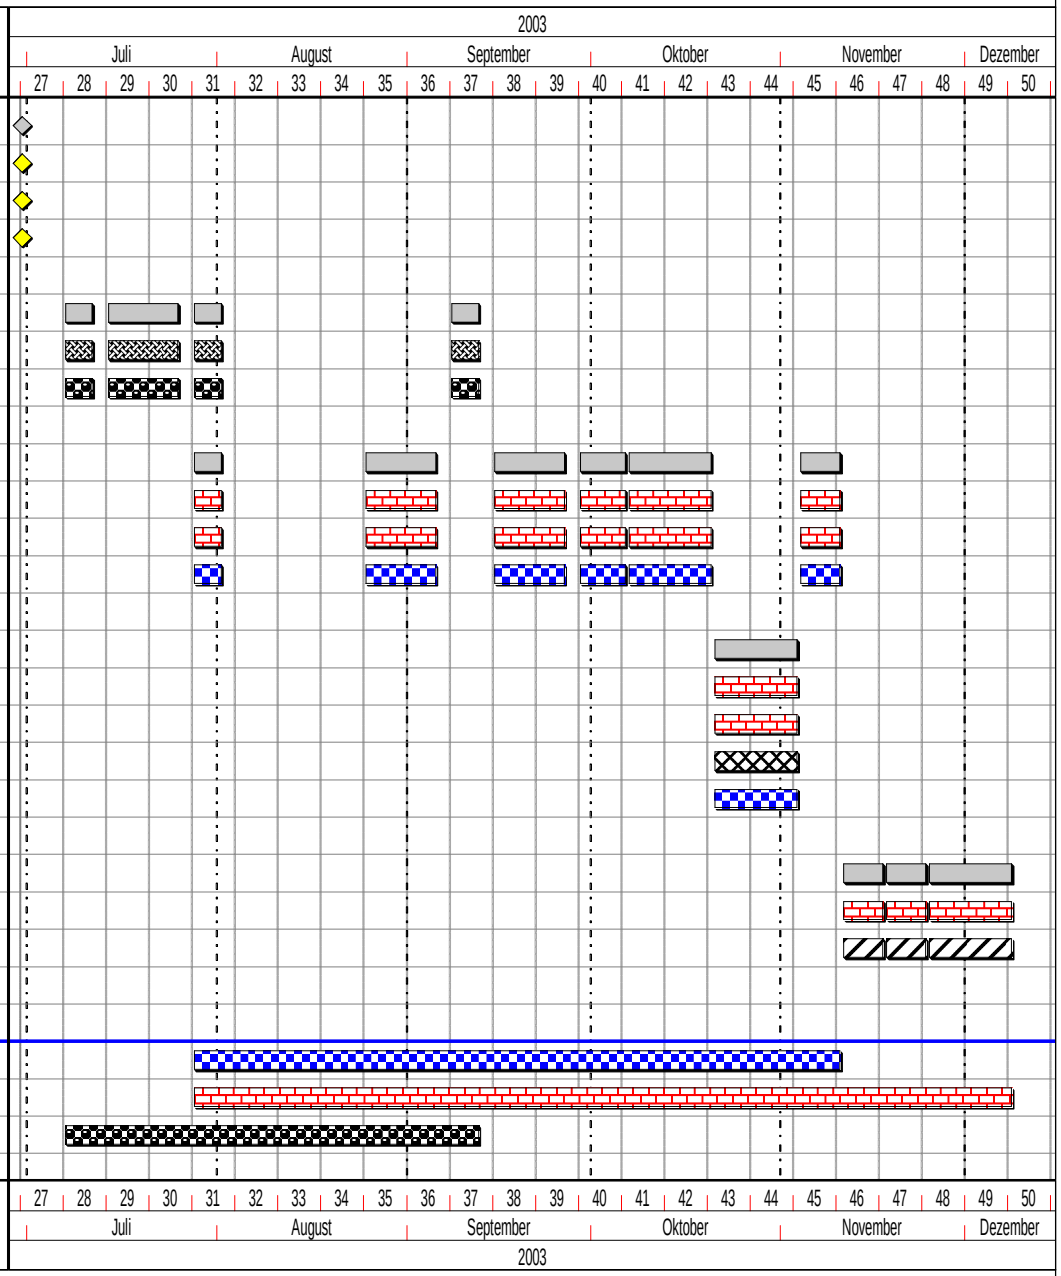


Druckdatum: 05.04.2004

*Asta Easyplan / Asta Powerproject / Asta Teamplan*
